



Contexte & Objectifs

A partir des données extraites d'un logiciel de gestion de projets entre 2018 et début 2022



Réalisation d'un tableau de bord pour

- *Suivre l'avancement des projets*
- *Identifier les retards*
- *Contrôler les performances*
- *Arbitrer les décisions à prendre*



Product Strategy Canvas

Un seul tableau de bord pour différentes attentes

Utilisateurs	Stories	Valeur métier
Directeur Général	<i>J'ai besoin d'être alerté lors d'écarts de performance des projets (>15%) pour décider rapidement. Je veux une vue globale pour piloter l'entreprise.</i>	<i>Réduire les risques stratégiques. Prioriser les projets critiques.</i>
Directeur Régional	<i>J'ai besoin d'être alerté des performances des projets dans ma région pour intervenir. Je veux suivre les projets régionaux.</i>	<i>Accélérer les actions correctives. Escalader les projets à risque.</i>
Directeur Pays	<i>J'ai besoin d'avoir une vision sur les indicateurs des projets (couts, délais, livrables) de mon pays. Je veux comprendre les causes des écarts.</i>	<i>Optimiser l'exécution locale. Mettre en place un plan correctif.</i>

Synthèse du nettoyage des données sur Power Query



Objectif : consolider les données prévisionnelles et réelles des projets SANITORIAL pour suivre la performance par phase, par projet et par zone géographique.

1. Dim_Project



Objectif : créer la dimension Projet en y associant les attributs de localisation et de classification.



Sources utilisées :

- Projects_Locations (projets, pays, régions)
- Project Type (type de projet)
- Country_Profiles (référentiel pays/régions)



Principales transformations :

- Fusion des projets avec leur type
- Fusion avec le référentiel pays/régions
- Correction des noms de pays
- Gestion des régions manquantes
- Complétion et standardisation des régions
- Typage des colonnes



Résultat : dimension Projet enrichie avec les attributs suivants :

- Project ID
- Project Type
- Country
- Region

2. Dim_Phase



Objectif : créer la dimension Phase à partir des données des projets.



Source utilisée :

projets_plans (données brutes des projets)



Principales transformations :

- Extraction du code de phase
- Extraction du libellé de phase
- Suppression des doublons
- Typage des colonnes



Résultat : dimension Phase avec :

- Phase (code)
- Libelle_phase (libellé)

3. Fact_Project



Objectif : construire la table factuelle centrale en consolidant les données prévisionnelles et réelles des projets par phase.



Sources utilisées :

- Fact_Planned (données prévues)
- Fact_Actual (données réelles)



Principales transformations :

- Fusion du prévisionnel et du réel sur la clé « Project Phase »
- Harmonisation des colonnes et des types
- Calcul de la date de fin prévue :
 $\text{End Date Planned} = \text{Start Date} + \text{Planned_Duration}$
- Réorganisation des colonnes




Résultat : table factuelle finale contenant :


- Dates de début et fin réelles et prévues
- Durées prévues et réelles
- Coûts prévus et réels
- Livrables prévus et réels
- Identifiants projet et phase

Modèle de données

Construction d'un modèle en étoile offrant une vision complète de la performance des projets

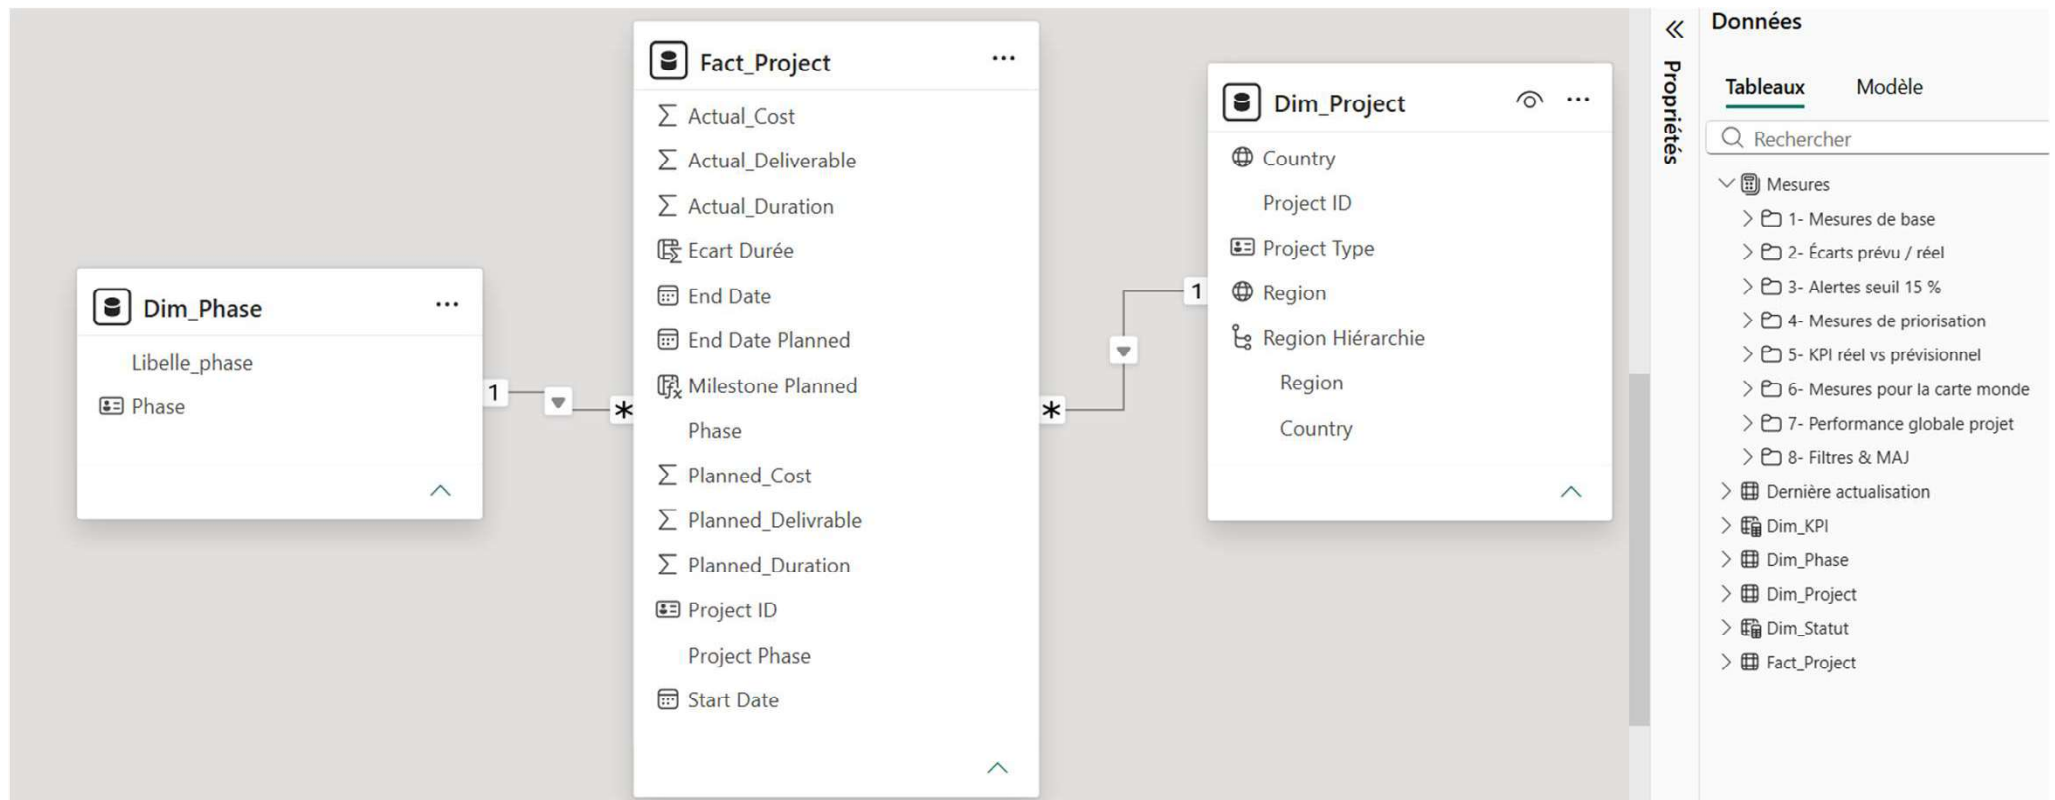

Rapport Power BI

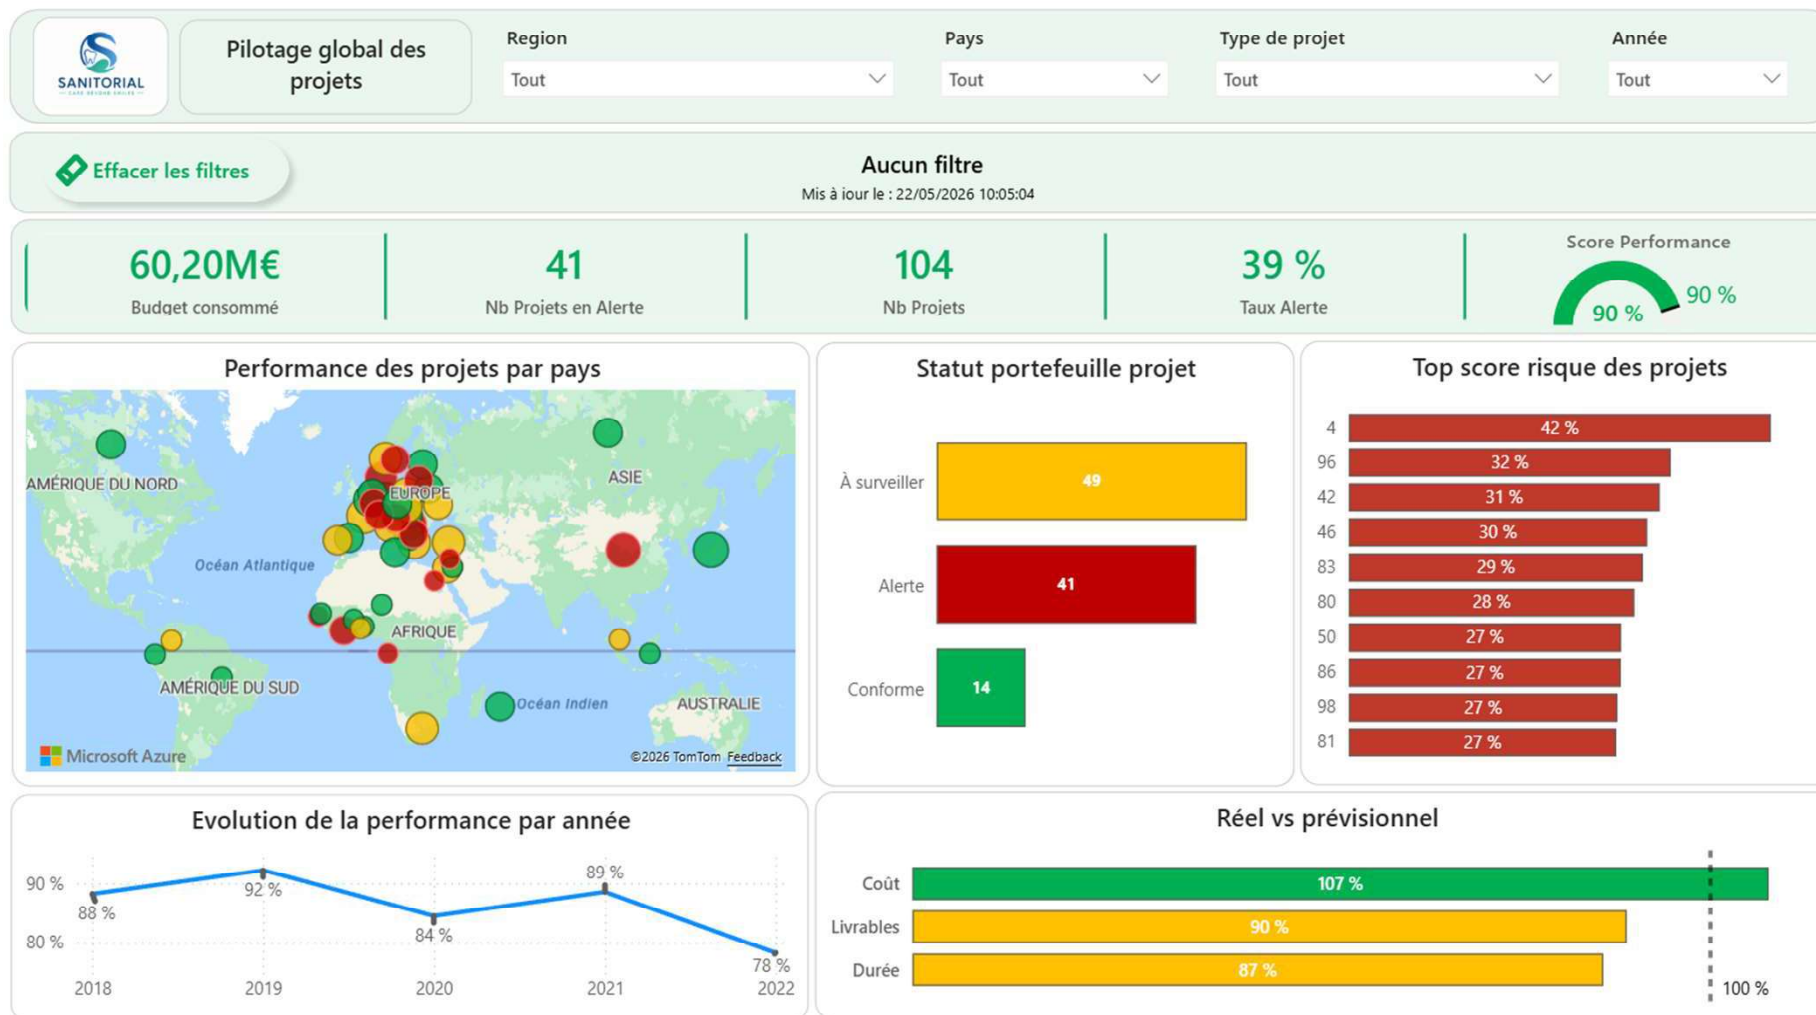



Proposition d'axe stratégique

- Le projet de pilotage SANITORIAL vise à améliorer la maîtrise du portefeuille projets en suivant trois dimensions clés :
 - la performance globale,
 - le niveau de risque,
 - le respect des engagements (coûts, délais, livrables).
- Le tableau de bord fournit une vision adaptée aux différents niveaux de décision :
 - stratégique pour la direction,
 - analytique pour le suivi régional,
 - opérationnelle pour le pilotage des projets et des phases.
- L'analyse met en évidence plusieurs enjeux :
 - un score Performance global proche de la cible (90 %) mais fragile,
 - un taux d'alerte élevé (39 %),
 - des surcoûts projets (107 % du budget prévu),
 - ainsi que des retards et écarts sur les livrables.
- L'objectif stratégique consiste donc à :
 - réduire les projets en alerte,
 - sécuriser les délais,
 - améliorer la maîtrise budgétaire,
 - homogénéiser les pratiques de pilotage projet à l'échelle internationale.

- **Recommandation principale**
 - Prioriser les actions correctives sur les pays et projets les plus en difficulté,
 - renforcer le suivi des projets "À surveiller",
 - mettre en place un pilotage plus rigoureux des coûts, délais et livrables afin de stabiliser durablement la performance du portefeuille.
